

2021年 8月 30日

アスベスト分析結果報告書

天理市長 様

ご依頼の試料についての分析結果を以下の通り報告致します。

件 名	北保育所建替え工事		
採 取 日	2021年6月22日、25日、29日、7月2日		
採 取 者	[REDACTED]		
試料受付方法	宅配		
分 析 項 目	アスベスト定性・定量分析		
分 析 方 法	定性分析	JIS A 1481-1:2016 建材製品中のアスベスト含有率測定方法 第1部：市販バルク材からの試料採取及び定性的判定方法	
	定量分析	JIS A 1481-3:2016 建材製品中のアスベスト含有率測定方法 第3部：アスベスト含有率のX線回折定量分析方法	
分 析 責 任 者	[REDACTED]	公益社団法人 日本作業環境測定協会 JIS A 1481-1 公益社団法人 日本作業環境測定協会 JIS A 1481-3 (Aランク)	
分 析 期 間	2021年7月21日 ～ 2021年8月27日		
試 料 名 称	アスベスト含有率判定結果		別添
	アスベストの有無	アスベストの種類	データNo.
アスベスト分析結果一覧表に記載			
備 考			

アスベスト分析結果一覧表

No.	試料名称	アスベスト含有率判定結果		定量分析結果	別添 データNo.
		アスベストの有無	アスベストの種類	アスベスト含有率(%)	
1	コンクリート壁-1, 2, 3	不検出	—	—	別添No. 1
2	外壁①-1, 2, 3	不検出	—	—	別添No. 2
3	外壁②-1, 2, 3	不検出	—	—	別添No. 3
4	軒裏①-1, 2, 3	不検出	—	—	別添No. 4
5	軒裏②-1, 2, 3	検出	クリソタイル	11.3	別添No. 5
6	保健室前開放廊下 断熱材-1, 2, 3	不検出	—	—	別添No. 6
7	乳児室前廊下 床シート①	不検出	—	—	別添No. 7
8	調乳室床シート②	不検出	—	—	別添No. 8
9	和室天井①-1, 2, 3	不検出	—	—	別添No. 9
10	浴室天井②-1, 2, 3	検出	クリソタイル	5.0	別添No. 10
11	物入れ（保健室横）天井③-1, 2, 3	不検出	—	—	別添No. 11
12	物入れ（保健室横）天井④-1, 2, 4	不検出	—	—	別添No. 12
13	遊戯室倉庫天井⑤-1, 2, 3	不検出	—	—	別添No. 13
14	保健室（キリン）洗面天井⑥-1, 2, 3	不検出	—	—	別添No. 14
15	和室内壁①-1, 2, 3	検出	クリソタイル	9.0	別添No. 15
16	保育室（バンビ）内壁②-1, 2, 3	不検出	—	—	別添No. 16
17	物入（保健室横）③-1, 2, 3	不検出	—	—	別添No. 17
18	保健室（きりん）洗面内壁④-1, 2, 3	検出	クリソタイル	7.3	別添No. 18
19	パッキン	検出	クリソタイル	47.1	別添No. 19
20	保温材①	不検出	—	—	別添No. 20
21	物入（オイルタンク室）保温材②	不検出	—	—	別添No. 21
	以下余白				



試料採取履歴

試料名(建材名称)	コンクリート壁ー1, 2, 3
試料の概要(形状、材質、大きさ等)	約100cm ²
採取場所	S48新築建物、S58増築建物
採取部位	外壁
採取日	2021年6月22日
採取者	

アスベスト定性分析

分析方法: JIS A 1481-1:2016

建材製品中のアスベスト含有率測定方法 第1部:市販バルク材からの試料採取及び定性的判定方法

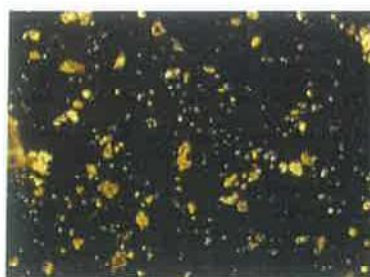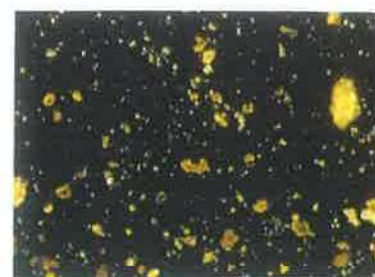伸長の符号
無し屈折率(1.550) 垂直
アスベストの分散色無し屈折率(1.550) 平行
アスベストの分散色無し

石綿の種類	定性分析結果
クリソタイル	不検出
アモサイト	不検出
クロシドライト	不検出
トレモライト	不検出
アクチノライト	不検出
アンソフィライト	不検出

アスベスト定量分析

分析方法: JIS A 1481-3:2016

建材製品中のアスベスト含有率測定方法 第3部:アスベスト含有率の X 線回折定量分析方法

石綿の種類	定量分析結果
クリソタイル	—
アモサイト	—
クロシドライト	—
トレモライト	—
アクチノライト	—
アンソフィライト	—

試料採取履歴

試料名(建材名称)	外壁①ー1, 2, 3
試料の概要(形状、材質、大きさ等)	約100cm ²
採取場所	S48新築建物、S58増築建物
採取部位	外壁
採取日	2021年6月22日
採取者	

アスベスト定性分析

分析方法: JIS A 1481-1:2016

建材製品中のアスベスト含有率測定方法 第1部:市販バルク材からの試料採取及び定性的判定方法



伸長の符号

無し



屈折率(1.550) 垂直

アスベストの分散色無し



屈折率(1.550) 平行

アスベストの分散色無し

石綿の種類	定性分析結果
クリソタイル	不検出
アモサイト	不検出
クロシドライト	不検出
トレモライト	不検出
アクチノライト	不検出
アンソフィライト	不検出

アスベスト定量分析

分析方法: JIS A 1481-3:2016

建材製品中のアスベスト含有率測定方法 第3部:アスベスト含有率の X 線回折定量分析方法

石綿の種類	定量分析結果
クリソタイル	—
アモサイト	—
クロシドライト	—
トレモライト	—
アクチノライト	—
アンソフィライト	—

試料採取履歴

試料名(建材名称)	外壁②ー1, 2, 3
試料の概要(形状、材質、大きさ等)	約100cm ²
採取場所	S48新築建物、S58増築建物
採取部位	外壁
採取日	2021年6月22日
採取者	

アスベスト定性分析


分析方法: JIS A 1481-1:2016

建材製品中のアスベスト含有率測定方法 第1部:市販バルク材からの試料採取及び定性的判定方法




伸長の符号

無し

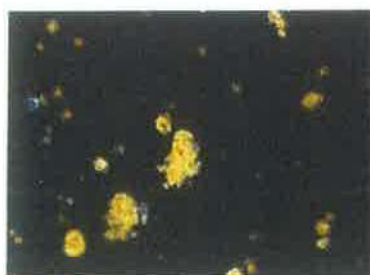

屈折率(1.550) 垂直

アスベストの分散色無し

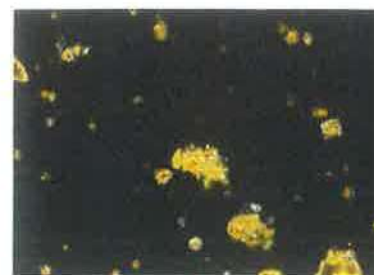

屈折率(1.550) 平行

アスベストの分散色無し

石綿の種類	定性分析結果
クリソタイル	不検出
アモサイト	不検出
クロシドライト	不検出
トレモライト	不検出
アクチノライト	不検出
アンソフィライト	不検出

アスベスト定量分析

分析方法: JIS A 1481-3:2016

建材製品中のアスベスト含有率測定方法 第3部:アスベスト含有率の X 線回折定量分析方法

石綿の種類	定量分析結果
クリソタイル	—
アモサイト	—
クロシドライト	—
トレモライト	—
アクチノライト	—
アンソフィライト	—

試料採取履歴

試料名(建材名称)	軒裏①ー1, 2, 3
試料の概要(形状、材質、大きさ等)	約100cm ²
採取場所	S48新築建物、S58増築建物
採取部位	軒裏
採取日	2021年6月25日
採取者	

アスベスト定性分析


分析方法: JIS A 1481-1:2016

建材製品中のアスベスト含有率測定方法 第1部:市販バルク材からの試料採取及び定性的判定方法



伸長の符号

無し

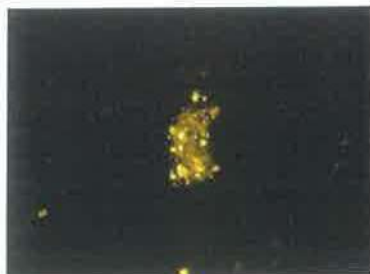

屈折率(1.550) 垂直

アスベストの分散色無し



屈折率(1.550) 平行

アスベストの分散色無し

石綿の種類	定性分析結果
クリソタイル	不検出
アモサイト	不検出
クロシドライト	不検出
トレモライト	不検出
アクチノライト	不検出
アンソフィライト	不検出

アスベスト定量分析

分析方法: JIS A 1481-3:2016

建材製品中のアスベスト含有率測定方法 第3部:アスベスト含有率の X 線回折定量分析方法

石綿の種類	定量分析結果
クリソタイル	—
アモサイト	—
クロシドライト	—
トレモライト	—
アクチノライト	—
アンソフィライト	—

試料採取履歴

試料名(建材名称)	軒裏②ー1, 2, 3
試料の概要(形状、材質、大きさ等)	約100cm ²
採取場所	S48新築建物、S58増築建物
採取部位	軒裏
採取日	2021年7月2日
採取者	

アスベスト定性分析

分析方法: JIS A 1481-1:2016

建材製品中のアスベスト含有率測定方法 第1部:市販バルク材からの試料採取及び定性的判定方法



伸長の符号

正



屈折率(1.550) 垂直

クリソタイルの分散色有り



屈折率(1.550) 平行

クリソタイルの分散色有り

石綿の種類	定性分析結果
クリソタイル	検出
アモサイト	不検出
クロシドライト	不検出
トレモライト	不検出
アクチノライト	不検出
アンソフィライト	不検出

アスベスト定量分析

分析方法: JIS A 1481-3:2016

建材製品中のアスベスト含有率測定方法 第3部:アスベスト含有率のX線回折定量分析方法

石綿の種類	定量分析結果
クリソタイル	11.3%
アモサイト	—
クロシドライト	—
トレモライト	—
アクチノライト	—
アンソフィライト	—


試料採取履歴

試料名(建材名称)	乳児室前廊下 床シート①
試料の概要(形状、材質、大きさ等)	約100cm ²
採取場所	S48新築建物、S58増築建物
採取部位	床
採取日	2021年6月25日
採取者	

アスベスト定性分析

分析方法: JIS A 1481-1:2016

建材製品中のアスベスト含有率測定方法 第1部:市販バルク材からの試料採取及び定性的判定方法

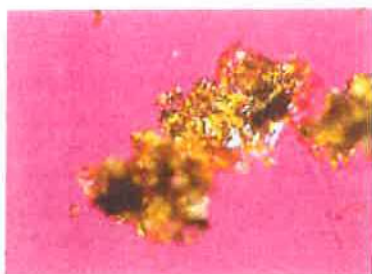


伸長の符号

無し



屈折率(1.550) 垂直

アスベストの分散色無し

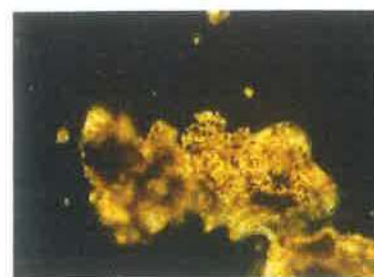

屈折率(1.550) 平行

アスベストの分散色無し

石綿の種類	定性分析結果
クリソタイル	不検出
アモサイト	不検出
クロシドライト	不検出
トレモライト	不検出
アクチノライト	不検出
アンソフィライト	不検出

アスベスト定量分析

分析方法: JIS A 1481-3:2016

建材製品中のアスベスト含有率測定方法 第3部:アスベスト含有率の X 線回折定量分析方法

石綿の種類	定量分析結果
クリソタイル	—
アモサイト	—
クロシドライト	—
トレモライト	—
アクチノライト	—
アンソフィライト	—


試料採取履歴

試料名(建材名称)	調乳室床シート②
試料の概要(形状、材質、大きさ等)	約100cm ²
採取場所	S48新築建物、S58増築建物
採取部位	床
採取日	2021年6月25日
採取者	

アスベスト定性分析


分析方法: JIS A 1481-1:2016

建材製品中のアスベスト含有率測定方法 第1部:市販バルク材からの試料採取及び定性的判定方法

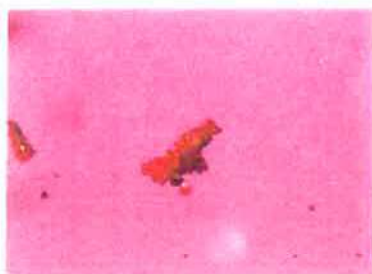


伸長の符号

無し

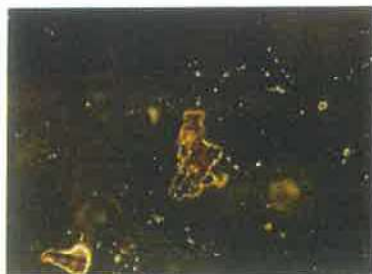

屈折率(1.550) 垂直

アスベストの分散色無し

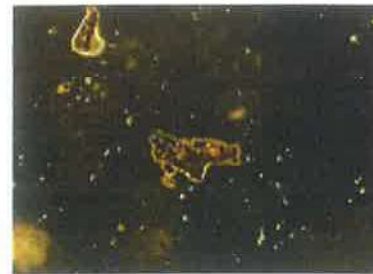

屈折率(1.550) 平行

アスベストの分散色無し

石綿の種類	定性分析結果
クリソタイル	不検出
アモサイト	不検出
クロシドライト	不検出
トレモライト	不検出
アクチノライト	不検出
アンソフィライト	不検出

アスベスト定量分析

分析方法: JIS A 1481-3:2016

建材製品中のアスベスト含有率測定方法 第3部:アスベスト含有率の X 線回折定量分析方法

石綿の種類	定量分析結果
クリソタイル	—
アモサイト	—
クロシドライト	—
トレモライト	—
アクチノライト	—
アンソフィライト	—


試料採取履歴

試料名(建材名称)	和室天井①ー1, 2, 3
試料の概要(形状、材質、大きさ等)	約100cm ²
採取場所	S48新築建物、S58増築建物
採取部位	天井
採取日	2021年6月29日
採取者	

アスベスト定性分析

分析方法: JIS A 1481-1:2016

建材製品中のアスベスト含有率測定方法 第1部:市販バルク材からの試料採取及び定性的判定方法

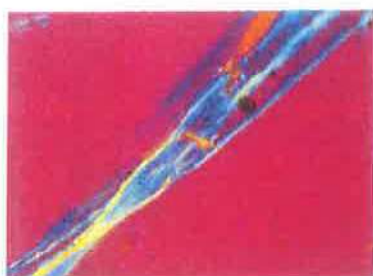

伸長の符号

無し



屈折率(1.550) 垂直

アスベストの分散色無し



屈折率(1.550) 平行

アスベストの分散色無し

石綿の種類	定性分析結果
クリソタイル	不検出
アモサイト	不検出
クロシドライト	不検出
トレモライト	不検出
アクチノライト	不検出
アンソフィライト	不検出

アスベスト定量分析

分析方法: JIS A 1481-3:2016

建材製品中のアスベスト含有率測定方法 第3部:アスベスト含有率のX線回折定量分析方法

石綿の種類	定量分析結果
クリソタイル	—
アモサイト	—
クロシドライト	—
トレモライト	—
アクチノライト	—
アンソフィライト	—


試料採取履歴

試料名(建材名称)	浴室天井②ー1, 2, 3
試料の概要(形状、材質、大きさ等)	約100cm ²
採取場所	S48新築建物、S58増築建物
採取部位	天井
採取日	2021年6月29日
採取者	

アスベスト定性分析


分析方法: JIS A 1481-1:2016

建材製品中のアスベスト含有率測定方法 第1部:市販バルク材からの試料採取及び定性的判定方法

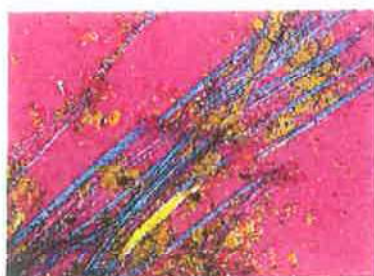


伸長の符号

正

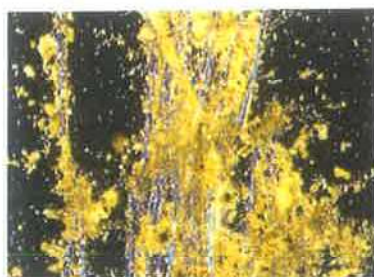

屈折率(1.550) 垂直

クリソタイルの分散色有り

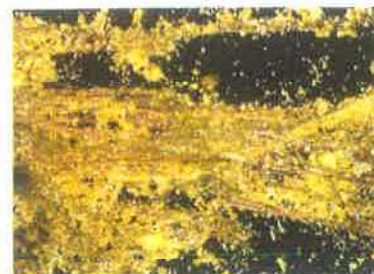

屈折率(1.550) 平行

クリソタイルの分散色有り

石綿の種類	定性分析結果
クリソタイル	検出
アモサイト	不検出
クロシドライト	不検出
トレモライト	不検出
アクチノライト	不検出
アンソフィライト	不検出

アスベスト定量分析

分析方法: JIS A 1481-3:2016

建材製品中のアスベスト含有率測定方法 第3部:アスベスト含有率の X 線回折定量分析方法

石綿の種類	定量分析結果
クリソタイル	5.0%
アモサイト	—
クロシドライト	—
トレモライト	—
アクチノライト	—
アンソフィライト	—

試料採取履歴

試料名(建材名称)	物入れ(保健室横)天井③ー1, 2, 3
試料の概要(形状、材質、大きさ等)	約100cm ²
採取場所	S48新築建物、S58増築建物
採取部位	天井
採取日	2021年7月2日
採取者	

アスベスト定性分析


分析方法: JIS A 1481-1:2016

建材製品中のアスベスト含有率測定方法 第1部:市販バルク材からの試料採取及び定性的判定方法



伸長の符号

無し

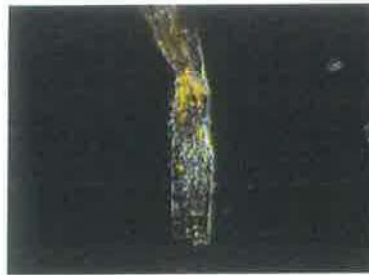

屈折率(1.550) 垂直

アスベストの分散色無し



屈折率(1.550) 平行

アスベストの分散色無し

石綿の種類	定性分析結果
クリソタイル	不検出
アモサイト	不検出
クロシドライト	不検出
トレモライト	不検出
アクチノライト	不検出
アンソフィライト	不検出

アスベスト定量分析

分析方法: JIS A 1481-3:2016

建材製品中のアスベスト含有率測定方法 第3部:アスベスト含有率のX線回折定量分析方法

石綿の種類	定量分析結果
クリソタイル	—
アモサイト	—
クロシドライト	—
トレモライト	—
アクチノライト	—
アンソフィライト	—

試料採取履歴

試料名(建材名称)	物入れ(保健室横)天井④ー1, 2, 4
試料の概要(形状、材質、大きさ等)	約100cm ²
採取場所	S48新築建物、S58増築建物
採取部位	天井
採取日	2021年7月2日
採取者	

アスベスト定性分析


分析方法: JIS A 1481-1:2016

建材製品中のアスベスト含有率測定方法 第1部:市販バルク材からの試料採取及び定性的判定方法




伸長の符号

無し

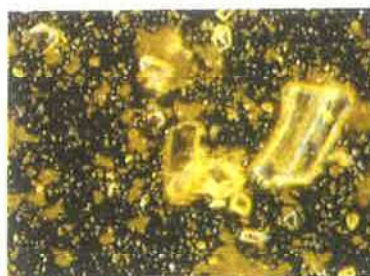

屈折率(1.550) 垂直

アスベストの分散色無し

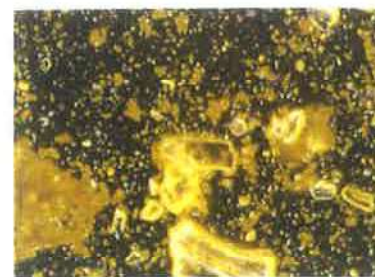

屈折率(1.550) 平行

アスベストの分散色無し

石綿の種類	定性分析結果
クリソタイル	不検出
アモサイト	不検出
クロシドライト	不検出
トレモライト	不検出
アクチノライト	不検出
アンソフィライト	不検出

アスベスト定量分析

分析方法: JIS A 1481-3:2016

建材製品中のアスベスト含有率測定方法 第3部:アスベスト含有率の X 線回折定量分析方法

石綿の種類	定量分析結果
クリソタイル	—
アモサイト	—
クロシドライト	—
トレモライト	—
アクチノライト	—
アンソフィライト	—

試料採取履歴

試料名(建材名称)	遊戯室倉庫天井⑤ー1, 2, 3
試料の概要(形状、材質、大きさ等)	約100cm ²
採取場所	S48新築建物、S58増築建物
採取部位	天井
採取日	2021年6月29日
採取者	

アスベスト定性分析


分析方法: JIS A 1481-1:2016

建材製品中のアスベスト含有率測定方法 第1部:市販バルク材からの試料採取及び定性的判定方法



伸長の符号

無し

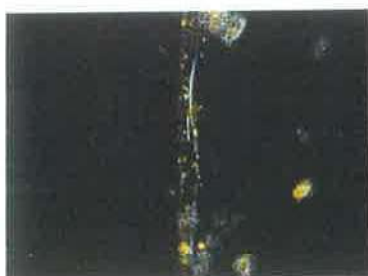

屈折率(1.550) 垂直

アスベストの分散色無し



屈折率(1.550) 平行

アスベストの分散色無し

石綿の種類	定性分析結果
クリソタイル	不検出
アモサイト	不検出
クロシドライト	不検出
トレモライト	不検出
アクチノライト	不検出
アンソフィライト	不検出

アスベスト定量分析

分析方法: JIS A 1481-3:2016

建材製品中のアスベスト含有率測定方法 第3部:アスベスト含有率の X 線回折定量分析方法

石綿の種類	定量分析結果
クリソタイル	—
アモサイト	—
クロシドライト	—
トレモライト	—
アクチノライト	—
アンソフィライト	—


試料採取履歴

試料名(建材名称)	保健室(キリン)洗面天井⑥ー1, 2, 3
試料の概要(形状、材質、大きさ等)	約100cm ²
採取場所	S48新築建物、S58増築建物
採取部位	天井
採取日	2021年7月2日
採取者	

アスベスト定性分析


分析方法: JIS A 1481-1:2016

建材製品中のアスベスト含有率測定方法 第1部:市販バルク材からの試料採取及び定性的判定方法

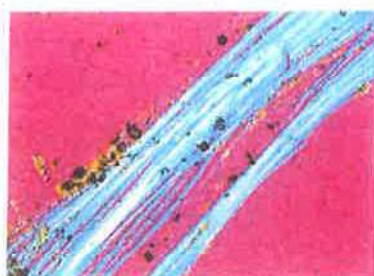

伸長の符号

正

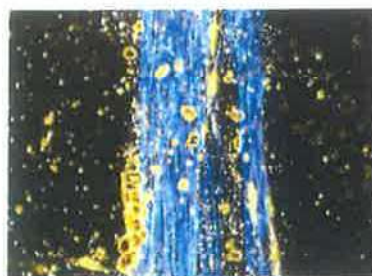

屈折率(1.550) 垂直

クリソタイルの分散色有り



屈折率(1.550) 平行

クリソタイルの分散色有り

石綿の種類	定性分析結果
クリソタイル	検出
アモサイト	不検出
クロシドライト	不検出
トレモライト	不検出
アクチノライト	不検出
アンソフィライト	不検出

アスベスト定量分析

分析方法: JIS A 1481-3:2016

建材製品中のアスベスト含有率測定方法 第3部:アスベスト含有率のX線回折定量分析方法

石綿の種類	定量分析結果
クリソタイル	9.0%
アモサイト	—
クロシドライト	—
トレモライト	—
アクチノライト	—
アンソフィライト	—

試料採取履歴

試料名(建材名称)	和室内壁①ー1, 2, 3
試料の概要(形状、材質、大きさ等)	約100cm ²
採取場所	S48新築建物、S58増築建物
採取部位	内壁
採取日	2021年6月29日
採取者	

アスベスト定性分析

分析方法: JIS A 1481-1:2016

建材製品中のアスベスト含有率測定方法 第1部:市販バルク材からの試料採取及び定性的判定方法




伸長の符号

無し



屈折率(1.550) 垂直

アスベストの分散色無し

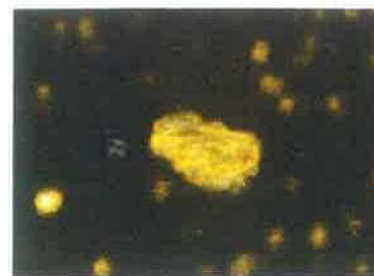

屈折率(1.550) 平行

アスベストの分散色無し

石綿の種類	定性分析結果
クリソタイル	不検出
アモサイト	不検出
クロシドライト	不検出
トレモライト	不検出
アクチノライト	不検出
アンソフィライト	不検出

アスベスト定量分析

分析方法: JIS A 1481-3:2016

建材製品中のアスベスト含有率測定方法 第3部:アスベスト含有率の X 線回折定量分析方法

石綿の種類	定量分析結果
クリソタイル	—
アモサイト	—
クロシドライト	—
トレモライト	—
アクチノライト	—
アンソフィライト	—

試料採取履歴

試料名(建材名称)	保育室(バンビ)内壁②—1, 2, 3
試料の概要(形状、材質、大きさ等)	約100cm ²
採取場所	S48新築建物、S58増築建物
採取部位	内壁
採取日	2021年6月22日
採取者	

アスベスト定性分析

分析方法: JIS A 1481-1:2016

建材製品中のアスベスト含有率測定方法 第1部:市販バルク材からの試料採取及び定性的判定方法



伸長の符号

無し



屈折率(1.550) 垂直

アスベストの分散色無し



屈折率(1.550) 平行

アスベストの分散色無し

石綿の種類	定性分析結果
クリソタイル	不検出
アモサイト	不検出
クロシドライト	不検出
トレモライト	不検出
アクチノライト	不検出
アンソフィライト	不検出

アスベスト定量分析

分析方法: JIS A 1481-3:2016

建材製品中のアスベスト含有率測定方法 第3部:アスベスト含有率のX線回折定量分析方法

石綿の種類	定量分析結果
クリソタイル	—
アモサイト	—
クロシドライト	—
トレモライト	—
アクチノライト	—
アンソフィライト	—

試料採取履歴

試料名(建材名称)	物入(保健室横)③ー1, 2, 3
試料の概要(形状、材質、大きさ等)	約100cm ²
採取場所	S48新築建物、S58増築建物
採取部位	内壁
採取日	2021年7月2日
採取者	

アスベスト定性分析

分析方法: JIS A 1481-1:2016

建材製品中のアスベスト含有率測定方法 第1部:市販バルク材からの試料採取及び定性的判定方法



伸長の符号

無し



屈折率(1.550) 垂直

アスベストの分散色無し



屈折率(1.550) 平行

アスベストの分散色無し

石綿の種類	定性分析結果
クリソタイル	不検出
アモサイト	不検出
クロシドライト	不検出
トレモライト	不検出
アクチノライト	不検出
アンソフィライト	不検出

アスベスト定量分析

分析方法: JIS A 1481-3:2016

建材製品中のアスベスト含有率測定方法 第3部:アスベスト含有率の X 線回折定量分析方法

石綿の種類	定量分析結果
クリソタイル	—
アモサイト	—
クロシドライト	—
トレモライト	—
アクチノライト	—
アンソフィライト	—


試料採取履歴

試料名(建材名称)	保健室(きりん)洗面内壁④ー1, 2, 3
試料の概要(形状、材質、大きさ等)	約100cm ²
採取場所	S48新築建物、S58増築建物
採取部位	内壁
採取日	2021年6月22日
採取者	

アスベスト定性分析


分析方法: JIS A 1481-1:2016

建材製品中のアスベスト含有率測定方法 第1部:市販バルク材からの試料採取及び定性的判定方法

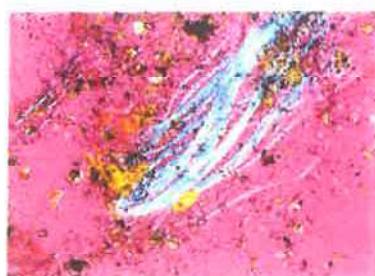


伸長の符号

正

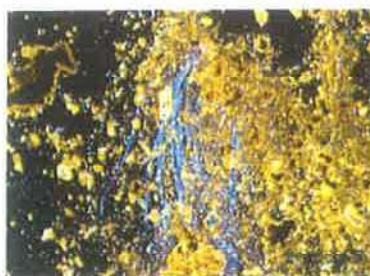

屈折率(1.550) 垂直

クリソタイルの分散色有り

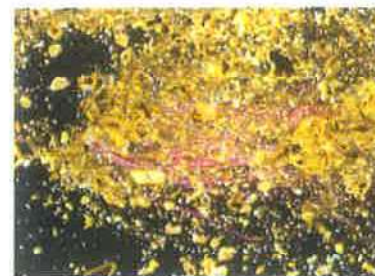

屈折率(1.550) 平行

クリソタイルの分散色有り

石綿の種類	定性分析結果
クリソタイル	検出
アモサイト	不検出
クロシドライト	不検出
トレモライト	不検出
アクチノライト	不検出
アンソフィライト	不検出

アスベスト定量分析

分析方法: JIS A 1481-3:2016

建材製品中のアスベスト含有率測定方法 第3部:アスベスト含有率の X 線回折定量分析方法

石綿の種類	定量分析結果
クリソタイル	7.3%
アモサイト	—
クロシドライト	—
トレモライト	—
アクチノライト	—
アンソフィライト	—



試料採取履歴

試料名(建材名称)	パッキン
試料の概要(形状、材質、大きさ等)	約100cm ²
採取場所	S48新築建物、S58増築建物
採取部位	設備配管
採取日	2021年6月25日
採取者	

アスベスト定性分析

分析方法: JIS A 1481-1:2016

建材製品中のアスベスト含有率測定方法 第1部:市販バルク材からの試料採取及び定性的判定方法

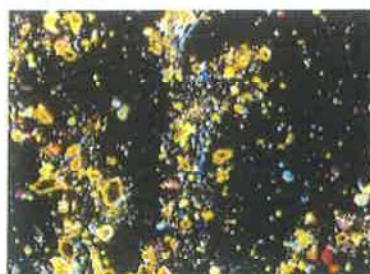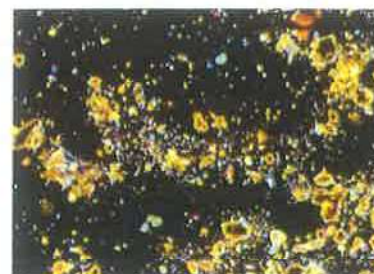伸長の符号
正屈折率(1.550) 垂直
クリソタイルの分散色有り屈折率(1.550) 平行
クリソタイルの分散色有り

石綿の種類	定性分析結果
クリソタイル	検出
アモサイト	不検出
クロシドライト	不検出
トレモライト	不検出
アクチノライト	不検出
アンソフィライト	不検出

アスベスト定量分析


分析方法: JIS A 1481-3:2016

建材製品中のアスベスト含有率測定方法 第3部:アスベスト含有率の X 線回折定量分析方法


石綿の種類	定量分析結果
クリソタイル	47.1%
アモサイト	—
クロシドライト	—
トレモライト	—
アクチノライト	—
アンソフィライト	—

試料名(建材名称)	保温材①
試料の概要(形状、材質、大きさ等)	約100cm ²
採 取 場 所	S48新築建物、S58増築建物
採 取 部 位	—
採 取 日	2021年6月25日
採 取 者	

無し

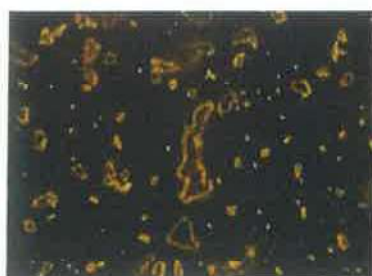

アスベストの分散色無し

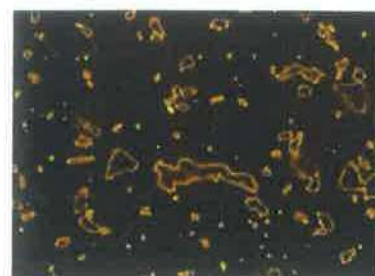

アスベストの分散色無し

石綿の種類	定性分析結果
クリソタイル	不検出
アモサイト	不検出
クロシドライト	不検出
トレモライト	不検出
アクチノライト	不検出
アンソフィライト	不検出

石綿の種類	定量分析結果
クリソタイル	—
アモサイト	—
クロシドライト	—
トレモライト	—
アクチノライト	—
アンソフィライト	—

試料採取履歴

試料名(建材名称)	物入(オイルタンク室)保温材②
試料の概要(形状、材質、大きさ等)	約100cm ²
採取場所	S48新築建物、S58増築建物
採取部位	—
採取日	2021年6月25日
採取者	■

アスベスト定性分析

分析方法: JIS A 1481-1:2016

建材製品中のアスベスト含有率測定方法 第1部:市販バルク材からの試料採取及び定性的判定方法




伸長の符号

無し



屈折率(1.550) 垂直

アスベストの分散色無し

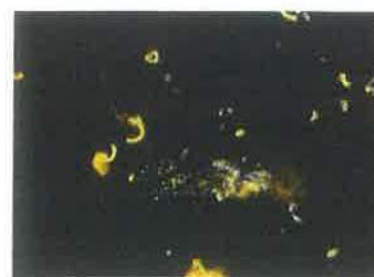

屈折率(1.550) 平行

アスベストの分散色無し

石綿の種類	定性分析結果
クリソタイル	不検出
アモサイト	不検出
クロシドライト	不検出
トレモライト	不検出
アクチノライト	不検出
アンソフィライト	不検出

アスベスト定量分析

分析方法: JIS A 1481-3:2016

建材製品中のアスベスト含有率測定方法 第3部:アスベスト含有率のX線回折定量分析方法

石綿の種類	定量分析結果
クリソタイル	—
アモサイト	—
クロシドライト	—
トレモライト	—
アクチノライト	—
アンソフィライト	—
